

施工報告書

竣工日：2015年7月27日（月）

住所：



埼玉県知事許可（般一24）第66916号


大功テクノ株式会社



シーリング撤去後マスキング養生。



3面接着防止の為、ボンドブレイカーが取れた所は、新たにボンドブレイカーを貼ります。赤いテープがボンドブレイカーです。

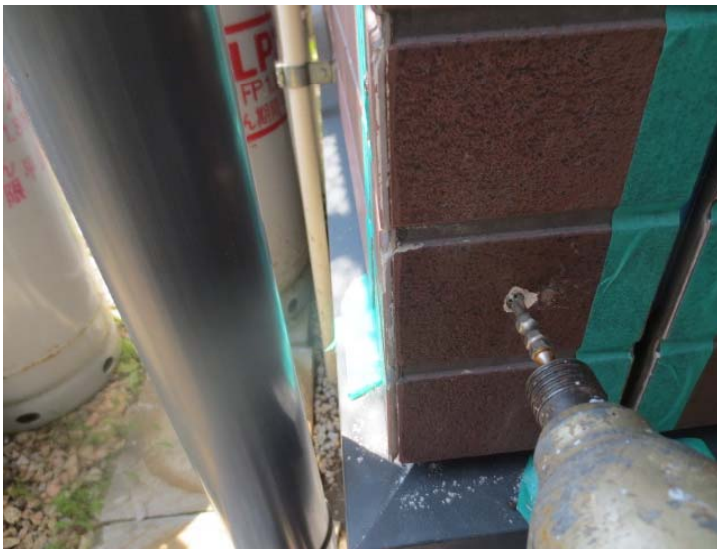

外壁サイディング材不陸調整。



プライマー塗布。シーリング材を密着させる為の接着剤です。



充填・押え後マスキング養生を剥がします。



出隅部分はVカット処理を行った後に充填します。



シャッターボックス錆止め塗装後。



外壁の下塗材を塗装しています。



外壁中塗り。



外壁上塗り。色が薄い部分が上塗りです。乾くと色が濃くなります。



同上。



同上。



塩ビ管も外壁塗料で同様に仕上げます。



バルコニー手摺はアルミ材の為、2液のエポキシ錆止めでプライマー処理をします。



幕板仕上げ塗り。



雨戸は鏡面の為、スプレー塗装で吹付けていきます。



バルコニーFRP防水表面の脱脂作業の為、表面を研磨し、ワックス分を粉にします。



アセトンシンナーにて表面のワックス分を拭取ります。この作業を行わないと、トップコートの剥がれの原因となります。



FRP防水面用のプライマーを塗装します。



仕上は、アクリルウレタントップコートです。



バルコニートップコート、アルミ笠木完了。
